Министерство ПАО «Газпром»
Объединение, трест **АО "Газстройпроект"**
Участок: I.II этап

Форма №3.3
Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
Миннефтегазстрой
Строительство: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
Объект: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)
Этап I.II.

АКТ № АИР 1.2-61.17-АР/2

о результатах проверки изделий/материалов

Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения D500/B3,5/F100 625x150x250 - 150,58 м3

на соответствие техдокументации

от 17 июля 2023 г.

Составлен представителями:

строительной организации *Руководитель группы МТО АО «Газстройпроект»* *Кострова Н.Л.*
(должность, организация, фамилия, инициалы)

службы контроля качества *Ведущий инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект»* *Ткаченко С.В.*
(должность, организация, фамилия, инициалы)

заказчика *Главный специалист Отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов ООО «Газпром инвест»* *Лбова П.А*
(должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, что произведен выборочный осмотр
(сплошной, выборочный)

Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения D500/B3,5/F100 625x150x250 - 150,58 м3
(наименование изделий/материалов)

предназначенных проектом № ***ПП2020РД-1.2-61.17-АР изм.2 л. 5, 6***
(номер проекта, чертежа, дата)

для строительства на участке : **Этап I.II. Служебное здание АС**
(привязка, км/ПК)

1. Осмотром геометрических размеров и маркировки:
совместно с проектом и сопроводительной документацией: ***Паспорт качества №197 от 09.07.2023***
(сертификатами, паспортами)

на изделия установлено,
что **Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения D500/B3,5/F100 625x150x250 - 150,58 м3**
(трубы, детали, силовые пояса и т.д.)

по своим геометрическим размерам -
(для труб указать диаметр, толщину стенки, мм, для отводов - угол изгиба, град. и т.д.)

и номеру технических условий, указанному на изделии, ***соответствует*** проекту (соответствует, не соответствует)
рабочие чертежи № ***ПП2020РД-1.2-61.17-АР изм.2 л. 5, 6***

2.Сопроводительная документация: ***Паспорт качества №197 от 09.07.2023***
(паспорта, сертификаты)

имеется в полном комплекте.

3. Характеристики механических свойств ***по данным сопроводительной документации***
(по данным сопроводительной документации, при необходимости - результатам испытаний)

соответствуют требованиям проекта № ***ПП2020РД-1.2-61.17-АР изм.2 л. 5, 6***

технических условий ***ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007***

Представитель строительной организации	Кострова Н.Л. (фамилия, инициалы)	(подпись)	17.07.2023 (дата)
Представитель службы контроля качества	Ткаченко С.В. (фамилия, инициалы)	(подпись)	17.07.2023 (дата)
Представитель заказчика	Лбова П.А (фамилия, инициалы)	(подпись)	17.07.2023 (дата)

ВК произведен в соответствиями с требованиями НТД

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО
БАШ. УПР.
ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР
АХМЕТОВ А.Г.

ПАО «ГАЗПРОМ»
ООО «ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР»
Строительный контроль Заказчика
(контроль качества)

3

Кладочный план стен и перегородок на отм. 0.000

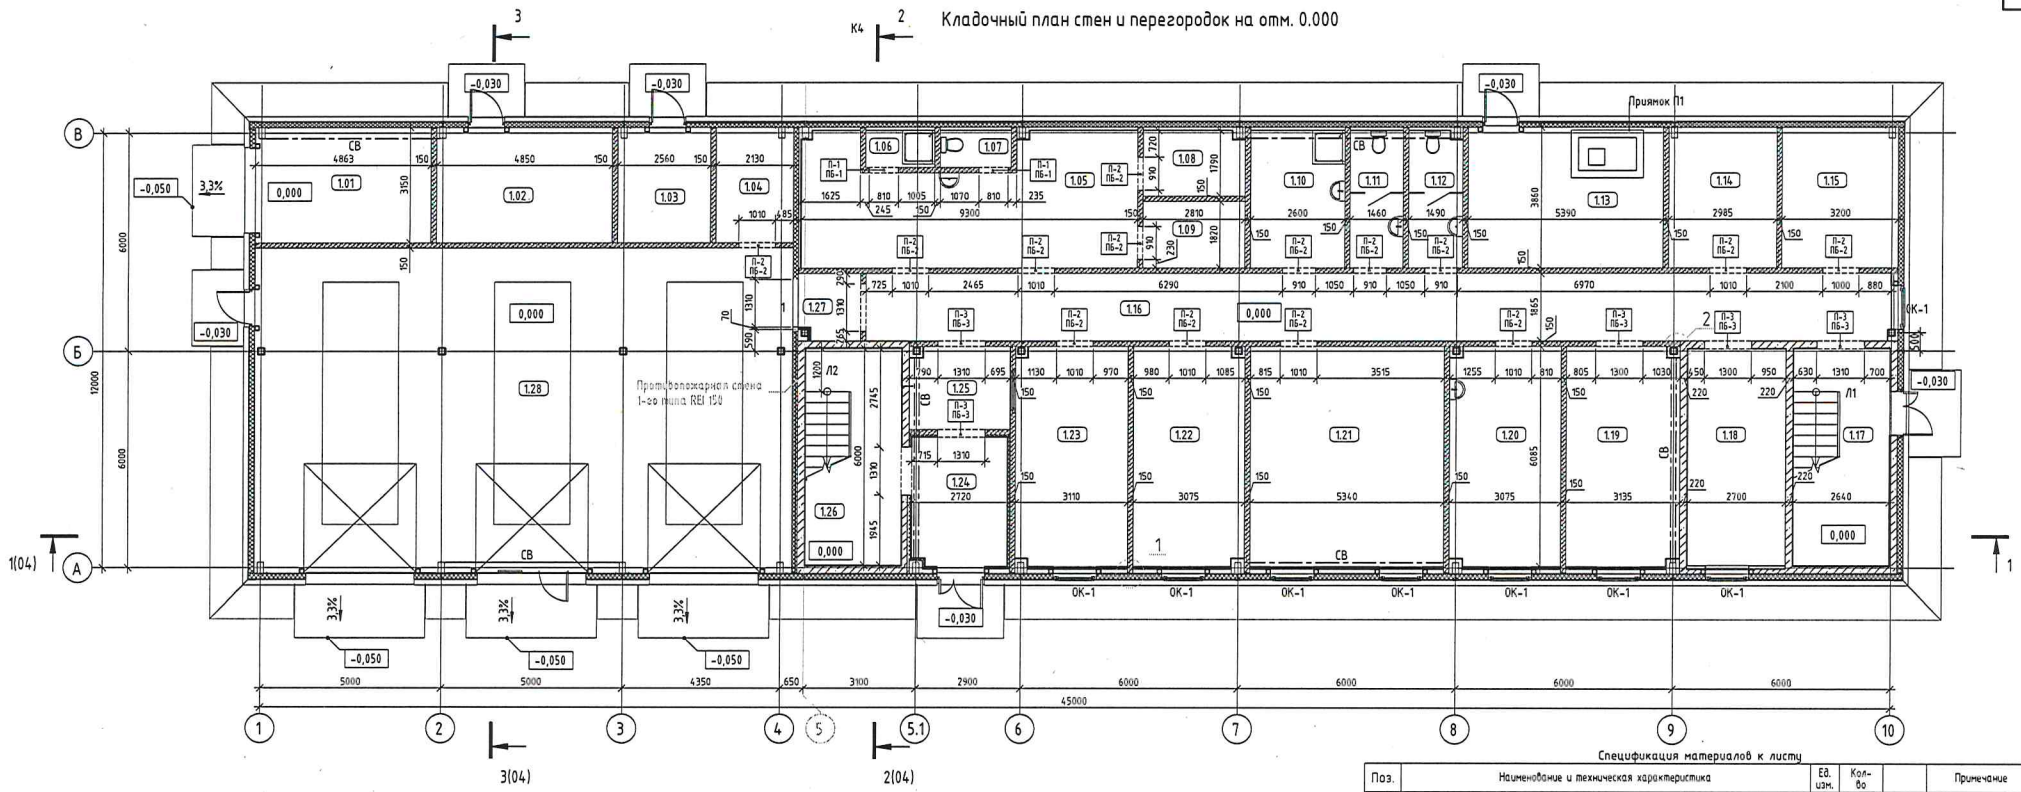

Узел 1

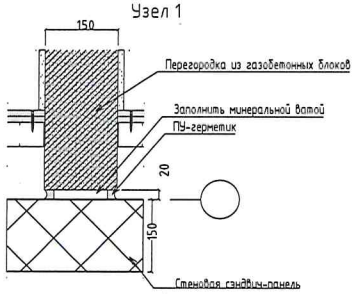

Узел 2

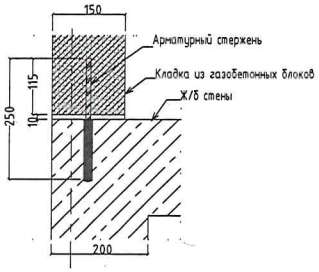

Узел примыкания перегородки к перекрытию

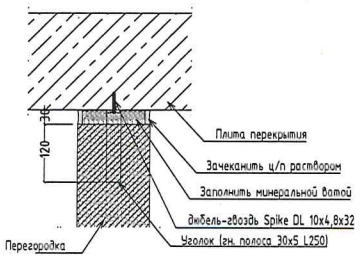

Ведомость перемычек

Марка, поз.	Схема сечения	Наименование	Марка по плотности	Размеры			Кол-во
				Длина	Высота	Ширина	
П-1		ПБ-1	D600	1 200	250	150	2
П-2		ПБ-2	D600	1 500	250	150	14
П-3		ПБ-3	D600	2 000	250	150	4

Условные обозначения

- Газобетонные перегородки
- Монолитные ж/б стены
- Стеновые сэндвич-панели
- П-ПБ- Марка перемычки
- ур.ч.п. уровень чистого пола

Спецификация материалов к листу

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Ед. изм.	Кол-во		Примечание
	Перегородки газобетонные, толщина 150мм				
	Блок I /625x150x250/D500/F100 ГОСТ 31360-2007 на кладочном растворе М100 ГОСТ Р 58272-2018	$м^3$	77,14		3291 шт (ориент)
	Клей для газобетона белый (ТУ 23.64.10-001-60982759-2021)	кг	1928,5		
	Арматура 8-А-III ГОСТ 5781-82.	пм	735,5		290,5кг
	Плиты минераловатные 160кг/$м^3$; толщ.30мм	$м^3$	1,41		см. узлы
	Уголок 150x100 (Полоса 30x5 ГОСТ 103-2006)	шт	49		14,42кг

1. Кладку перегородок выполнить из газобетонных блоков марки "Блок I /625x150x250/D500/F100" по ГОСТ 31360-2007; класс по прочности на сжатие не ниже В3,5. Каждый третий ряд кладки армировать арматурой 8-А-III ГОСТ 5781-82. (1 стержень на каждый армируемый ряд).
   Кладку перегородок вести на клеевом составе для тонкошовной кладки по ГОСТ Р 58272-2018 марки не ниже М100. Толщину шва выдерживать не более 5мм.
   По согласованию с заказчиком допускается применение материалов других марок с аналогичными свойствами.
2. Каждый армируемый ряд кладки внутренних перегородок из блоков крепить к ж/б стенам арматурными стержнями ф10 AIII L=250 на клеевом составе HILTI HFX 275/2/asia (один стержень на каждый армируемый ряд). (СМ узел 2)
3. Перегородки раскрепить к перекрытию с помощью уголка 100x150 из полосовой стали 50x5 ГОСТ 103-2006, с шагом 3,0м. см. узел 3
4. Монтаж газобетонных перегородок выполнить до устройства стяжек пола.
5. Привязки стен и проемов уточняются после монтажа и замеров монолитных ж/б и стальных несущих конструкций..
6. Перемычки в газобетонных перегородках установить на высоте 2070мм от ур.ч.п. (2170мм от ур. плиты перекрытия) если на планах не указано иное.
7. При монтаже перегородок соблюдать зазор до ж/б перекрытия 30мм. Зазор заполнить минераловатной полосой с зачеканкой ц/п раствором. см. узел 3.
8. В местах пересечения перегородок связями, связи обернуть технической изоляцией (Цилиндр ТЕХНО 80 1200x025x020 или аналог, подобрать по размеру связи).
9. ГКЛ-перегородки и обшивку выполнять по техкаталогу KNAUF, типы С112, С623, С626 с двухслойной обшивкой листами ГКЛ. Основной каркас принят на основе профилей ПС 50x50 и ПН 50x40.
10. Конструкции ж/б стен см. раздел КР
11. Металлоконструкции см. раздел КМ

2	-	Зам.	23/34		11.2023	ПП2020РД-1.2-61.17-АР
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II
Разраб.		Рубаник			2023	Служебное здание АС
Проверил		Никонов			2023	Стадия: Р; Лист: 5; Листов:
Н.контр.		Мусатова			2023	
ГИП		Бычков			2023	Кладочный план стен и перегородок 1 этажа на отм. 0.000

АИР МАГИСТРАЛЬ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2

Кладочный план стен и перегородок отм. +3.900

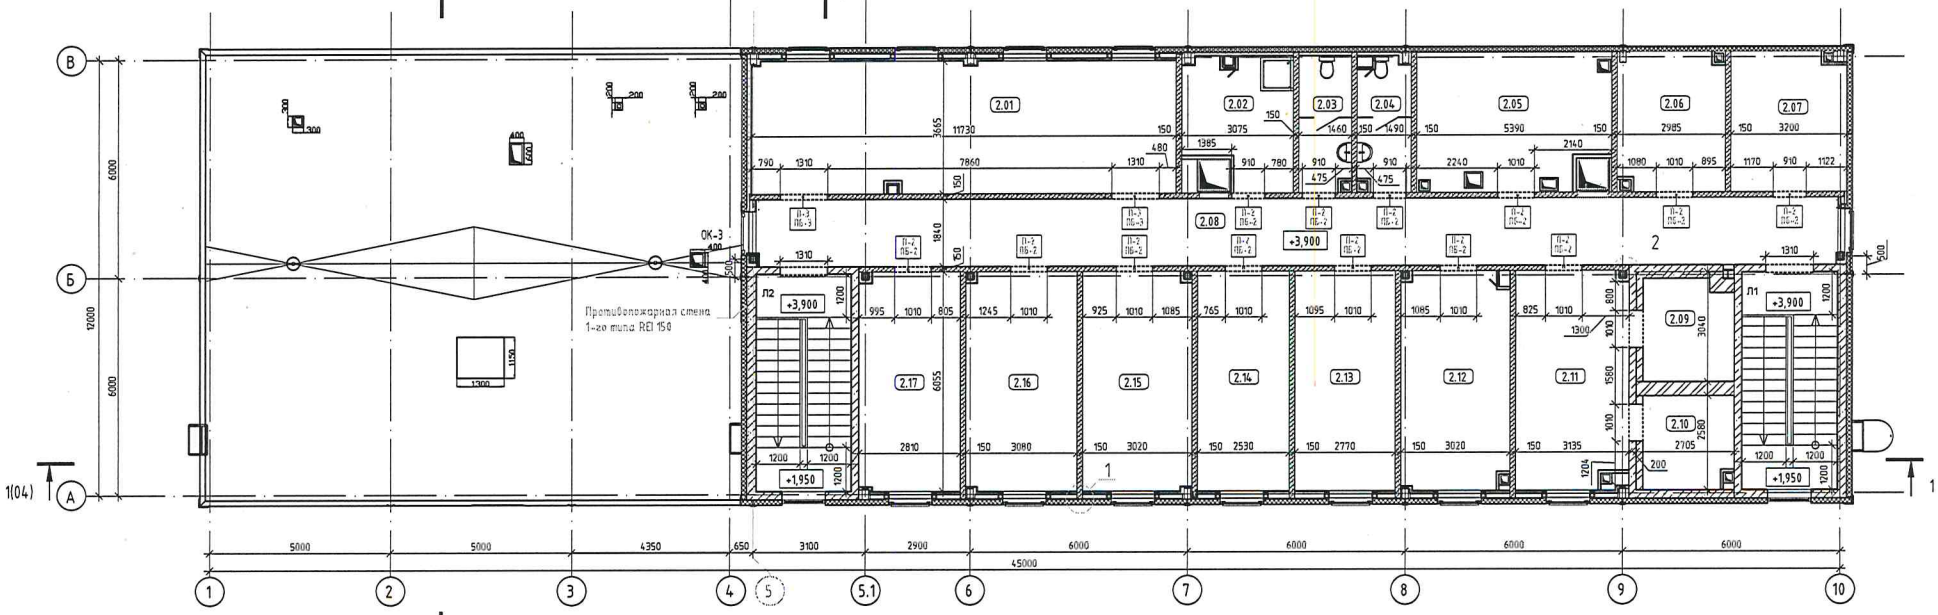

Узел 1

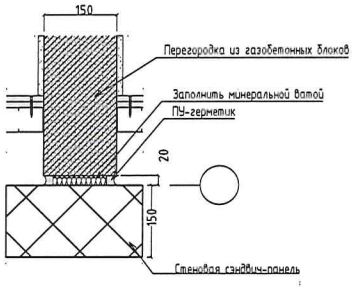

Узел 2

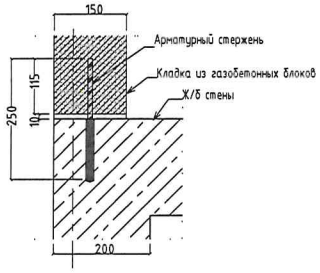

Узел примыкания перегородки к покрытию

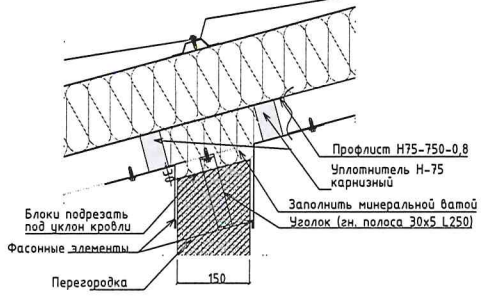

Ведомость перемычек

Марка, поз.	Схема сечения	Наименование	Марка по плотности	Размеры			Кол-во
				Длина	Высота	Ширина	
П-2		ПБ-2	D600	1 500	250	150	13
П-3		ПБ-3	D600	2 000	250	150	2

Примечания:

1. Кладку перегородок выполнить из газобетонных блоков марки "Блок I /625х150х250/D500/F100" по ГОСТ 31360-2007; класс по прочности на сжатие не ниже В3,5. Каждый третий ряд кладки армировать арматурой 8-А-III ГОСТ 5781-82. (1 стержень на каждый армируемый ряд).
   Кладку перегородок вести на клеевом составе для тонкошовной кладки по ГОСТ Р 58272-2018 марки не ниже М100. Толщину шва выдерживать не более 5мм.
   По согласованию с заказчиком допускается применение материалов других марок с аналогичными свойствами.
2. Каждый армируемый ряд кладки внутренних перегородок из блоков крепить к ж/б стенам арматурными стержнями ф10 AIII L=250 на клеевом составе HILTI HFX 275/2/asia (один стержень на каждый армируемый ряд). (СМ узел 2)
3. Перегородки раскрепить к металлоконструкциям кровли с помощью уголка 100х150 из полосовой стали 50х5 ГОСТ 103-2006, с шагом 3,0м. см. узел 4.
4. Монтаж газобетонных перегородок выполнить до устройства стяжек пола.
5. Привязки стен и проемов уточняются после монтажа и замеров монолитных ж/б и стальных несущих конструкций..
6. Перемычки в газобетонных перегородках установить на высоте 2070мм от ур.ч.п. (2170мм от ур. плиты перекрытия) если на планах не указано иное.
7. При монтаже перегородок соблюдать зазор до покрытия 30мм. С шагом 3м закрепить уголок из полосы 30х50. Зазор заполнить минераловатной полосой. С двух сторон обжать карнизным уплотнителем Н-75 и зафиксировать фасонными элементами из оц. стали по КМ. См. узел 4.
8. В местах пересечения перегородок связями, связи обернуть технической изоляцией (Цилиндр ТЕХНО ВО 1200х025х020 или аналог, подобрать по размеру связи).
9. ГКЛ-перегородки и обшивки выполнять по техкаталогу KNAUF, типы С112, С623, С626 с двухслойной обшивкой листами ГКЛ. Основной каркас принят на основе профилей ПС 50х50 и ПН 50х40.
10. Конструкции ж/б стен см. раздел КР
11. Металлоконструкции см. раздел КМ

Спецификация материалов к листу

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Масса ед.	Примечание
	Перегородки газобетонные, толщина 150мм				
	Блок I /625х150х250/D500/F25 ГОСТ 31360-2007 на кладочном растворе М100 ГОСТ Р 58272-2018	$м^3$	73,44		3133шт (ориент)
	Клей для газобетона белый (ТУ 23.64.10-001-60982759-2021)	кг	1836		
	Арматура 8-А-III ГОСТ 5781-82.	пм	786,3		310,6кг
	Плиты минераловатные 160кг/$м^3$; толщ.30мм	$м^3$	0,84		см. узлы
	Уголок 150х100 (Полоса 30х5 ГОСТ 103-2006)	шт	37		10,9кг
	Уплотнитель Н-75 карнизный	шт	280		---

Условные обозначения

- Газобетонные перегородки
- Монолитные ж/б стены
- Стеновые сэндвич-панели
- П-ПБ- Марка перемычки
- ур.ч.п. уровень чистого пола

						ПП2020РД-1.2-61.17-АР
2	-	Зам.	23/34		11.2023	Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Рубаник			2023	Служебное здание АС
Проверил		Никонов			2023	
Н.контр.		Мусатова			2023	
ГИП		Бычков			2023	Кладочный план стен и перегородок на отм.+3.900 М 1:100

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

АИР МАГИСТРАЛЬ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2

Общество с ограниченной ответственностью

ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Свидетельство № СР О-П-077-11122009
Заказчик - ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»

I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК -258).
Этап I.II

Служебное здание АС

Рабочая документация

Архитектурные решения

ПП2020РД-1.2-61.17-АР

Изм.	№	Подп.	Дата
1	23/20		09.2023
2	23/34		11.2023

2023
Санкт-Петербург

ОРИГИНАЛ В АОРПИ № АИР 1.2-61.2-АР/2

ЛСР

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

ГОСТ 31 360-2007 ГОСТ 31 359-2007

Паспорт качества №197

Выдан 09.07.2023

Наименование изделий	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения**
Условное обозначение изделий	Блок ЛСР **D500**
Размеры изделий, мм (ДхШхВ)	625*150*250
Номер партии	172
Дата изготовления изделий	05.07.2023
Объем партии, м3	473
Класс по прочности на сжатие	В 3,5
Марка по средней плотности	D500
Марка по морозостойкости	F100
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф, Бк/кг	Не более 370
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, λ_0 [Вт/ (м · °С)]	0,12
Усадка при высыхании, (мм/м), не более	0,5
Коэффициент паропроницаемости μ [мг/(м·ч·Па)]	0,20

Инженер-лаборант КГЗ _____ Николаева В.И.

Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H15456
Срок действия с 01.07.2022 по 30.06.2025

ООО «ЛСР. Стеновые» КГЗ
187330 Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ш. Никольское, д. 55, каб. 201. ИНН / КПП 4706035757 / 470601001;
р/с 40702810655110179058 в Северо-Западном Банке ПАО Сбербанк г. СПб.. к/с 30101810500000000653, БИК 044030653
Офис продаж: тел. +7(812) 640-33-40
www.lsrstena.ru
