Министерство ПАО «Газпром»
Объединение, трест **АО "Газстройпроект"**
Участок: I.II этап

Форма №3.3
Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
Миннефтегазстрой
Строительство: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
Объект: Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»
I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258)
Этап I.II.

**АКТ № АИР 1.2-61.17-АР/3**
**о результатах проверки изделий/материалов**
**Клей для газобетона "Юником" - 3764,5 кг.**
**на соответствие техдокументации**
**от 15 сентября 2023 г.**

Составлен представителями:
строительной организации *Руководитель группы МТО АО «Газстройпроект»* *Кострова Н.Л.*
(должность, организация, фамилия, инициалы)
службы контроля качества *Инженер отдела технического надзора АО «Газстройпроект»* *Халыгов Э. А.*
(должность, организация, фамилия, инициалы)
заказчика *Главный специалист Отдела организации и контроля материально-технического обеспечения Управления по реализации проектов ООО «Газпром инвест»* *Лбова П.А*
(должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, что произведен выборочный осмотр
(сплошной, выборочный )

**Клей для газобетона "Юником" - 3764,5 кг.**
(наименование изделий/материалов)

предназначенных проектом № ***ПП2020РД-1.2-61.17-АР изм.2 л. 5, 6***
(номер проекта, чертежа, дата)

для строительства на участке : **Этап I.II. Служебное здание АС**
(привязка, км/ПК)

1. Осмотром геометрических размеров и маркировки:
совместно с проектом и сопроводительной документацией: ***Паспорт качества №13/09/56 от 13.09.2023***
(сертификатами, паспортами)

на изделия установлено,
что **Клей для газобетона "Юником" - 3764,5 кг.**
(трубы, детали, силовые пояса и т.д.)

по своим геометрическим размерам -
(для труб указать диаметр, толщину стенки, мм, для отводов - угол изгиба, град. и т.д.)

и номеру технических условий, указанному на изделии, ***соответствует*** проекту (соответствует, не соответствует)
рабочие чертежи № ***ПП2020РД-1.2-61.17-АР изм.2 л. 5, 6***

2.Сопроводительная документация: ***Паспорт качества №13/09/56 от 13.09.2023***
(паспорта, сертификаты)

имеется в полном комплекте.

3. Характеристики механических свойств ***по данным сопроводительной документации***
(по данным сопроводительной документации, при необходимости - результатам испытаний)

соответствуют требованиям проекта № ***ПП2020РД-1.2-61.17-АР изм.2 л. 5, 6***
технических условий ***ТУ 23.64.10-001-60982759-2021***

| | | | |
|---|---|---|---|
| Представитель строительной организации | Кострова Н.Л. (фамилия, инициалы) | (подпись) | 15.09.2023 (дата) |
| Представитель службы контроля качества | Халыгов Э. А. (фамилия, инициалы) | (подпись) | 15.09.2023 (дата) |
| Представитель заказчика | Лбова П.А (фамилия, инициалы) | (подпись) | 15.09.2023 (дата) |

**ВК произведен в соответствиями с требованиями НТД**

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО БАШ. УПР. ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР" АХМЕТОВ А.Г.

ПАО «ГАЗПРОМ» ООО «ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР» Строительный контроль Заказчика (контроль качества) 3

# Кладочный план стен и перегородок на отм. 0.000




## Спецификация материалов к листу

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | Перегородки газобетонные, толщина 150мм | | | | |
| | Блок I /625x150x250/D500/F100 ГОСТ 31360-2007 на кладочном растворе М100 ГОСТ Р 58272-2018 | $м^3$ | 77,14 | | 3291 шт (ориент) |
| | Клей для газобетона белый (ТУ 23.64.10-001-60982759-2021) | кг | 1928,5 | | |
| | Арматура 8-А-III ГОСТ 5781-82. | пм | 735,5 | | 290,5кг |
| | Плиты минераловатные 160кг/$м^3$; толщ.30мм | $м^3$ | 1,41 | | см. узлы |
| | Уголок 150x100 (Полоса 30x5 ГОСТ 103-2006) | шт | 49 | | 14,42кг |

1. Кладку перегородок выполнить из газобетонных блоков марки "Блок I /625x150x250/D500/F100" по ГОСТ 31360-2007; класс по прочности на сжатие не ниже В3,5. Каждый третий ряд кладки армировать арматурой 8-А-III ГОСТ 5781-82. (1 стержень на каждый армируемый ряд).
   Кладку перегородок вести на клеевом составе для тонкошовной кладки по ГОСТ Р 58272-2018 марки не ниже М100. Толщину шва выдерживать не более 5мм.
   По согласованию с заказчиком допускается применение материалов других марок с аналогичными свойствами.
2. Каждый армируемый ряд кладки внутренних перегородок из блоков крепить к ж/б стенам арматурными стержнями ф10 AIII L=250 на клеевом составе HILTI HFX 275/2/asia (один стержень на каждый армируемый ряд). (СМ узел 2)
3. Перегородки раскрепить к перекрытию с помощью уголка 100x150 из полосовой стали 50x5 ГОСТ 103-2006, с шагом 3,0м. см. узел 3
4. Монтаж газобетонных перегородок выполнить до устройства стяжек пола.
5. Привязки стен и проемов уточняются после монтажа и замеров монолитных ж/б и стальных несущих конструкций..
6. Перемычки в газобетонных перегородках установить на высоте 2070мм от ур.ч.п. (2170мм от ур. плиты перекрытия) если на планах не указано иное.
7. При монтаже перегородок соблюдать зазор до ж/б перекрытия 30мм. Зазор заполнить минераловатной полосой с зачеканкой ц/п раствором. см. узел 3.
8. В местах пересечения перегородок связями, связи обернуть технической изоляцией Цилиндр ТЕХНО 80 1200x025x020 или аналог, подобрать по размеру связи).
9. ГКЛ-перегородки и обшивки выполнять по техкаталогу KNAUF, типы С112, С623, С626 с двухслойной обшивкой листами ГКЛ. Основной каркас принят на основе профилей ПС 50x50 и ПН 50x40.
10. Конструкции ж/б стен см. раздел КР
11. Металлоконструкции см. раздел КМ

## Узел 1

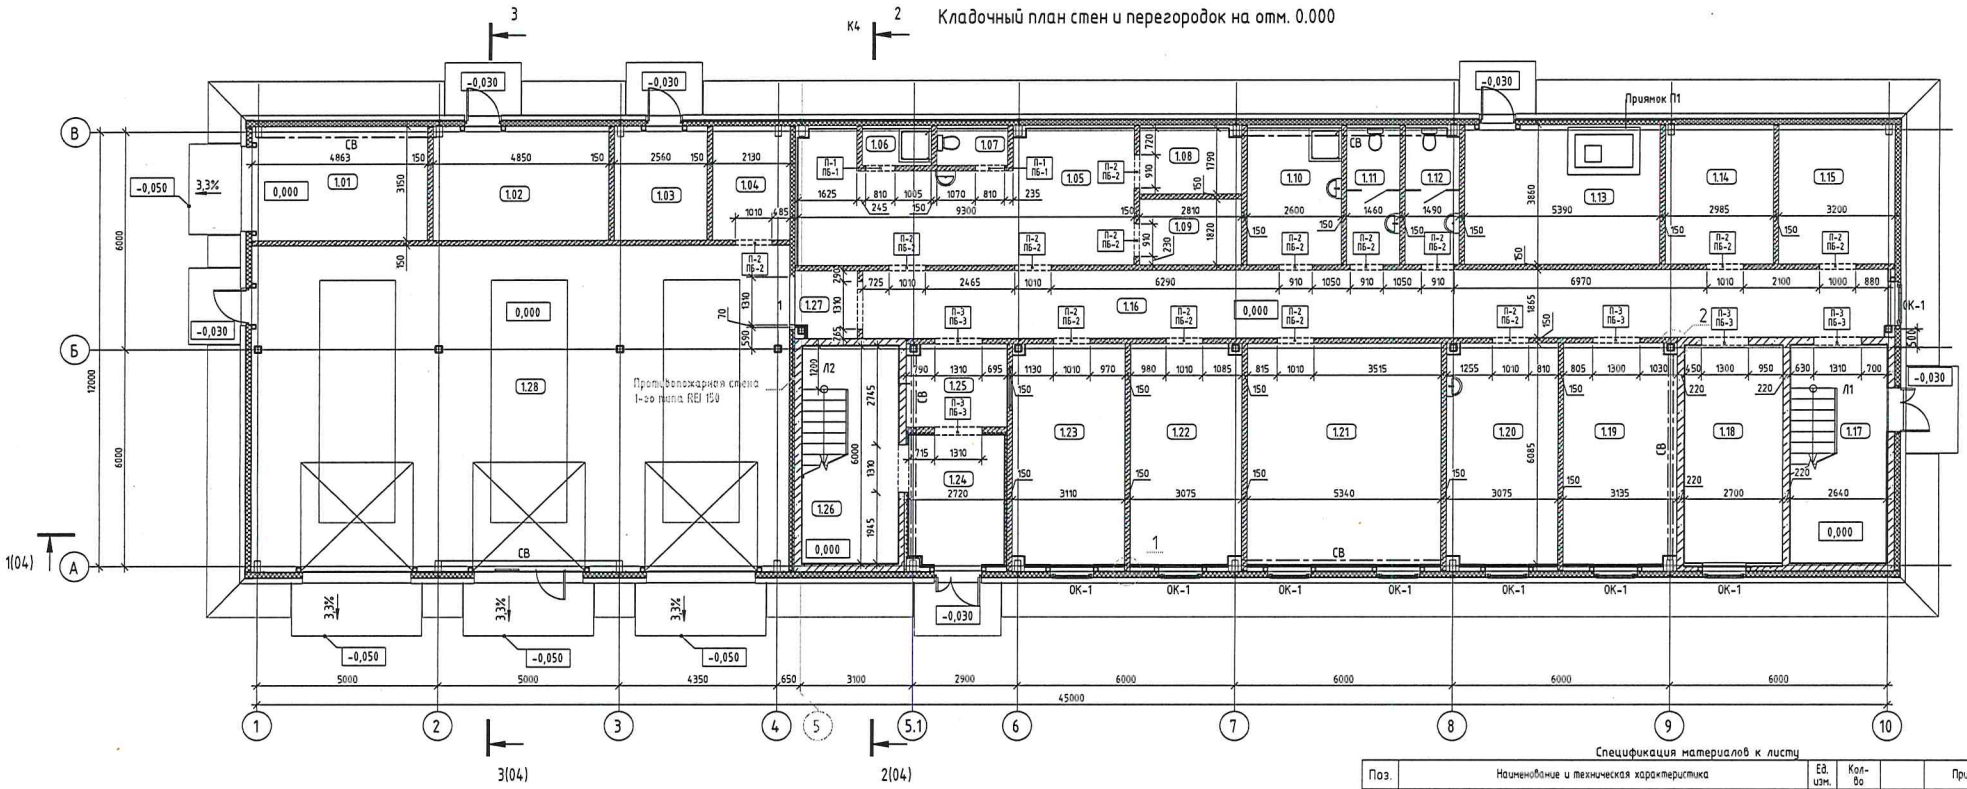


## Узел 2




## Узел примыкания перегородки к перекрытию

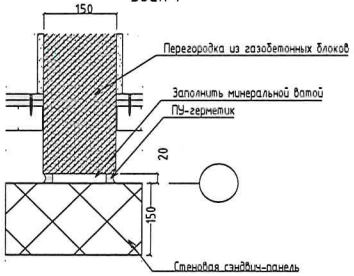


## Ведомость перемычек

| Марка, поз. | Схема сечения | Наименование | Марка по плотности | Размеры | | | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Длина | Высота | Ширина | |
| П-1 | | ПБ-1 | D600 | 1 200 | 250 | 150 | 2 |
| П-2 | | ПБ-2 | D600 | 1 500 | 250 | 150 | 14 |
| П-3 | | ПБ-3 | D600 | 2 000 | 250 | 150 | 4 |
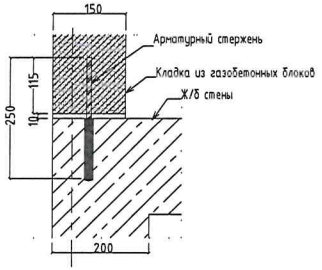
## Условные обозначения

- Газобетонные перегородки
- Монолитные ж/б стены
- Стеновые сэндвич-панели
- П-ПБ- Марка перемычки
- ур.ч.п. уровень чистого пола
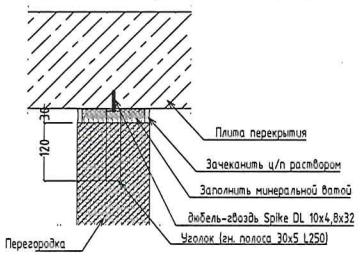
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ПП2020РД-1.2-61.17-АР |
| 2 | - | Зам. | 23/34 | | 11.2023 | Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата | |
| Разраб. | | Рубаник | | | 2023 | Служебное здание АС |
| Проверил | | Никонов | | | 2023 | Стадия: Р; Лист: 5; Листов: |
| Н.контр. | | Мусатова | | | 2023 | |
| ГИП | | Бычков | | | 2023 | Кладочный план стен и перегородок 1 этажа на отм. 0.000 |
| | | | | | | АИР МАГИСТРАЛЬ |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2

# Кладочный план стен и перегородок отм. +3.900




## Узел 1




## Узел 2

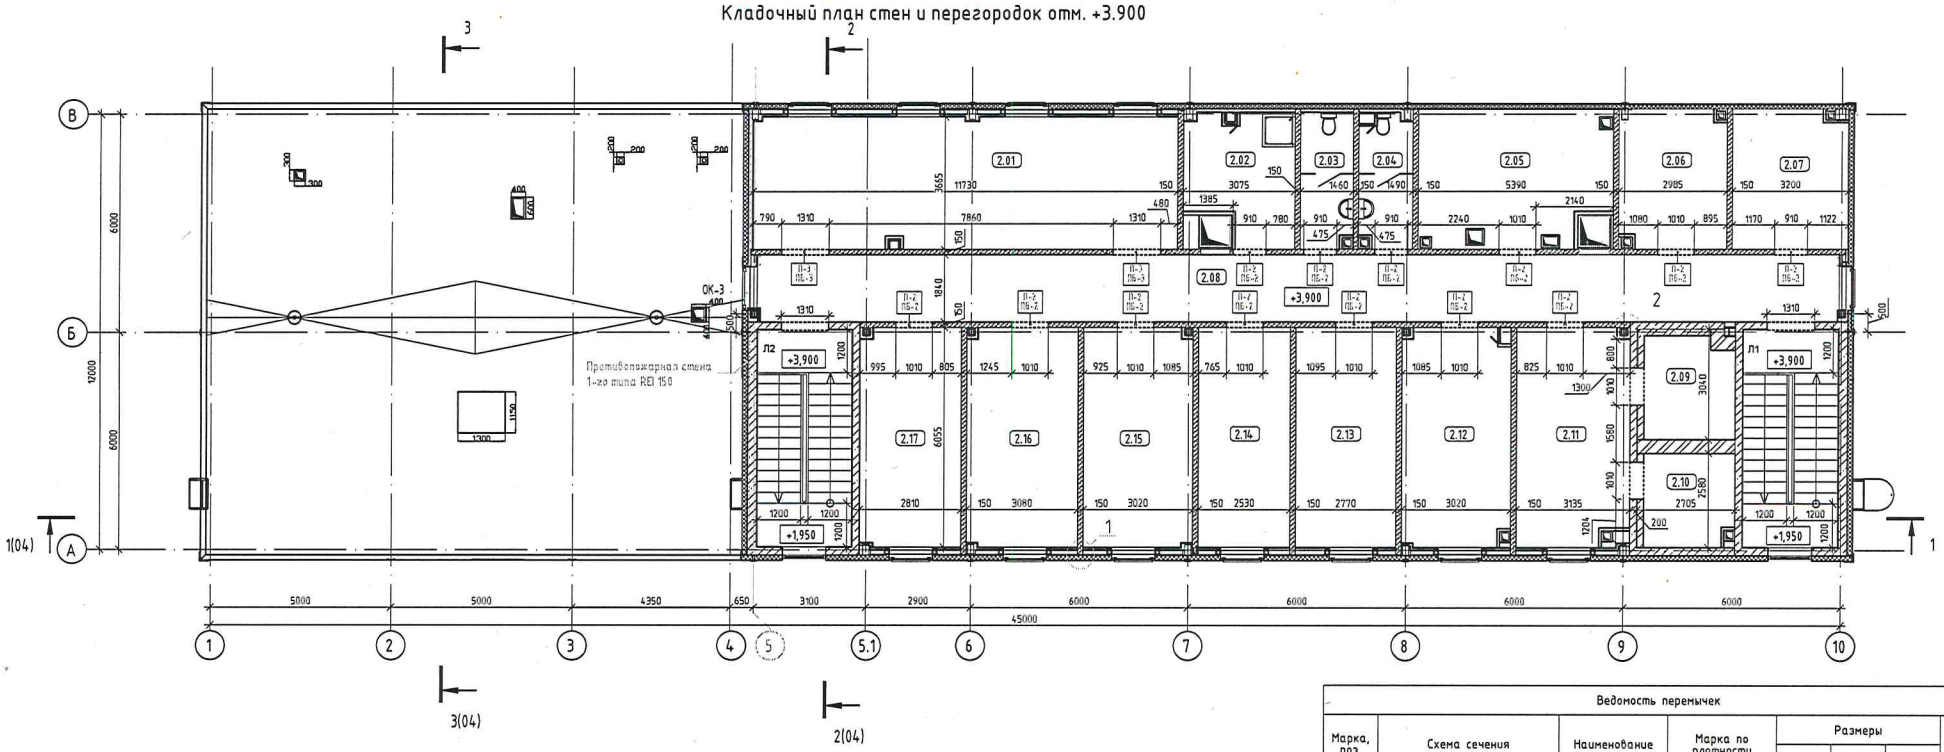


## Узел примыкания перегородки к покрытию

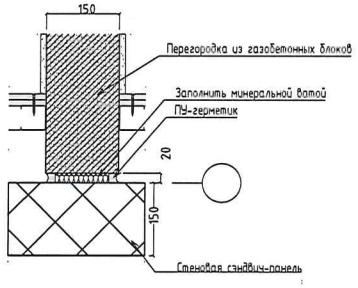


## Спецификация материалов к листу

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Масса ед. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | Перегородки газобетонные, толщина 150мм | | | | |
| | Блок I /625x150x250/D500/F25 ГОСТ 31360-2007 на кладочном растворе М100 ГОСТ Р 58272-2018 | $м^3$ | 73,44 | | 3133шт (ориент) |
| | Клей для газобетона белый (ТУ 23.64.10-001-60982759-2021) | кг | 1836 | | |
| | Арматура 8-А-III ГОСТ 5781-82. | пм | 786,3 | | 310,6кг |
| | Плиты минераловатные 160кг/$м^3$; толщ.30мм | $м^3$ | 0,84 | | см. узлы |
| | Уголок 150x100 (Полоса 30x5 ГОСТ 103-2006) | шт | 37 | | 10,9кг |
| | Уплотнитель Н-75 карнизный | шт | 280 | | --- |
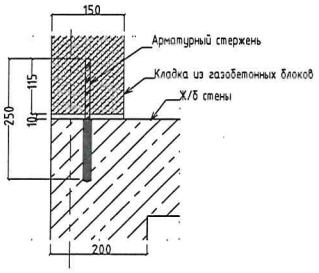
## Условные обозначения

- Газобетонные перегородки
- Монолитные ж/б стены
- Стеновые сэндвич-панели
- П-ПБ- Марка перемычки
- ур.ч.п. уровень чистого пола
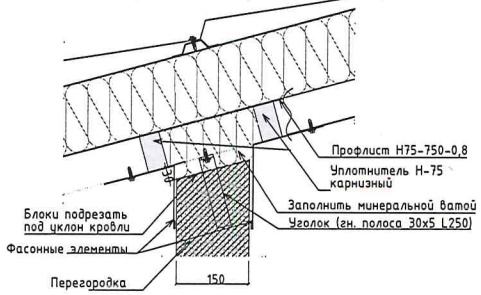
## Ведомость перемычек

| Марка, поз. | Схема сечения | Наименование | Марка по плотности | Размеры: Длина | Высота | Ширина | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П-2 | | ПБ-2 | D600 | 1 500 | 250 | 150 | 13 |
| П-3 | | ПБ-3 | D600 | 2 000 | 250 | 150 | 2 |

Примечания:

1. Кладку перегородок выполнить из газобетонных блоков марки "Блок I /625x150x250/D500/F100" по ГОСТ 31360-2007; класс по прочности на сжатие не ниже В3,5. Каждый третий ряд кладки армировать арматурой 8-А-III ГОСТ 5781-82. (1 стержень на каждый армируемый ряд).
   Кладку перегородок вести на клеевом составе для тонкошовной кладки по ГОСТ Р 58272-2018 марки не ниже М100. Толщину шва выдерживать не более 5мм.
   По согласованию с заказчиком допускается применение материалов других марок с аналогичными свойствами.
2. Каждый армируемый ряд кладки внутренних перегородок из блоков крепить к ж/б стенам арматурными стержнями ф10 AIII L=250 на клеевом составе HILTI HFX 275/2/asia (один стержень на каждый армируемый ряд). (СМ узел 2)
3. Перегородки раскрепить к металлоконструкциям кровли с помощью уголка 100x150 из полосовой стали 50x5 ГОСТ 103-2006, с шагом 3,0м. см. узел 4.
4. Монтаж газобетонных перегородок выполнить до устройства стяжек пола.
5. Привязки стен и проемов уточняются после монтажа и замеров монолитных ж/б и стальных несущих конструкций..
6. Перемычки в газобетонных перегородках установить на высоте 2070мм от ур.ч.п. (2170мм от ур. плиты перекрытия) если на планах не указано иное.
7. При монтаже перегородок соблюдать зазор до покрытия 30мм. С шагом 3м закрепить уголок из полосы 30x50. Зазор заполнить минераловатной полосой. С двух сторон обжать карнизным уплотнителем Н-75 и зафиксировать фасонными элементами из оц. стали по КМ. См. узел 4.
8. В местах пересечения перегородок связями, связи обернуть технической изоляцией (Цилиндр ТЕХНО 80 1200x025x020 или аналог, подобрать по размеру связи).
9. ГКЛ-перегородки и обшивки выполнять по техкаталогу KNAUF, типы С112, С623, С626 с двухслойной обшивкой листами ГКЛ. Основной каркас принят на основе профилей ПС 50x50 и ПН 50x40.
10. Конструкции ж/б стен см. раздел КР
11. Металлоконструкции см. раздел КМ

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | Зам. | 23/34 | | 11.2023 |

ПП2020РД-1.2-61.17-АР

Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разраб. | Рубаник | | 2023 |
| Проверил | Никонов | | 2023 |
| Н.контр. | Мусатова | | 2023 |
| ГИП | Бычков | | 2023 |

Служебное здание АС

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 6 | |

Кладочный план стен и перегородок на отм.+3.900
М 1:100

АИР МАГИСТРАЛЬ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2

Общество с ограниченной ответственностью
ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Свидетельство № СР О-П-077-11122009
Заказчик - ООО «Газпром инвест»

# «Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»

I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК -258).
Этап I.II

**Служебное здание АС**

Рабочая документация

## Архитектурные решения

ПП2020РД-1.2-61.17-АР

| Изм. | № | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | 23/20 | | 09.2023 |
| 2 | 23/34 | | 11.2023 |
| | | | |

2023
Санкт-Петербург
